



**FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2016)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.**



2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHICOASEN, CHIAPAS. No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL: _____
 LOCALIDAD: CHICOASEN (BARRIO DOS BOCAS)
 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.
 RUBRO: URB.- URBANIZACION.
 PROGRAMA: CALLE (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)
 SUB-PROG: R.- REHABILITACION. NUMERO DE OBRA: 029-03-001.

[Handwritten signature]

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$473,994.91	F.I.S.M	\$473,994.91	F.I.S.M	\$0.00
RFNFFICIARIO	\$0.00	RFNFFICIARIO	\$0.00	RFNFFICIARIO	\$0.00
TOTAL	\$473,994.91	TOTAL	\$473,994.91	TOTAL	\$0.00

[Handwritten signature]



2015-2018

SINDICATURA MUNICIPAL

Modalidad de Ejecución: **CONTRATO.**

Descripcion de la Obra DEMOLICION DE 404.54 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO; EXCAVACION A MANO DE 82.38 M3 EN TERRENO TIPO "B" Y 20.59 M3 EN TERRENO "C"; 102.97 M3 DE RELLENO CON MATERIAL MEJORADO; 93.25 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F C= 150 KG/CM2 SECCION 15x20x40 CMS; 411.38 M2 DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES Y ACARREO EN CAMION DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICIONES.

Numero de Contrato DOHAC/FISM/001/2016

Periodo de Ejecucion
 Fecha de Inicio
 Programado real 08 DE AGOSTO DE 2016.

Avances
 Fisico: 100 %
 Financiero: 100 %

08 DE OCTUBRE DE 2016.

Convenios Modificatorios

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			


Observaciones



2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL

Fotografia de Obra Terminada

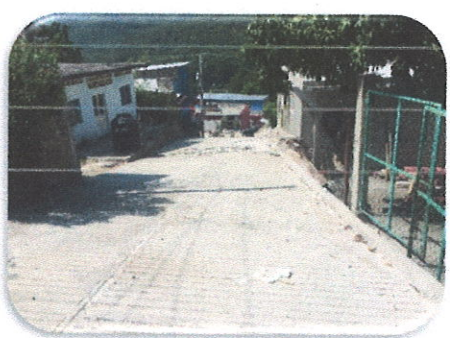

[Handwritten signature]



2015-2018

OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

[Handwritten signature]
