



**FICHA TECNICA DE OBRA ( F.I.S.M. - 2016)  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.**

**MUNICIPIO:** CHICOASEN, CHIAPAS. **No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL:**  
**LOCALIDAD:** CHICOASEN (BARRIO DOLORES)  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO  
**RUBRO:** AYS.- AGUA Y SANEAMIENTO.  
**PROGRAMA:** RED DE ALCANTARILLADO  
**SUB-PROG:** R.- REHABILITACION. **NUMERO DE OBRA:** 029-03-008.

**Situacion Financiera**

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$309,684.18	F.I.S.M	\$309,684.18	F.I.S.M	\$0.00
BENEFICIARIO	\$0.00	BENEFICIARIO	\$0.00	BENEFICIARIO	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$309,684.18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$309,684.18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: CONTRATO.**

**Descripcion de la Obra** REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO DOLORES QUE CONSISTE EN REHABILITACION 98.00 ML CON TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO PARA 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO, REPOSICION DE CONCRETO, EXCAVACION, RELLENOS, ACARREOS Y 2 POZOS DE VISITA. **Numero de Contrato** DOHAC/FISM/008/2016

**Periodo de Ejecucion**  
**Fecha de Inicio**  
 Programado real 29 DE AGOSTO DE 2016.  
 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

**Avances**  
**Fisico:** 100 %  
**Financiero:** 100 %




**Convenios Modificatorios**

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

**Observaciones**

2015-2018  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**Fotografia de Obra Terminada**

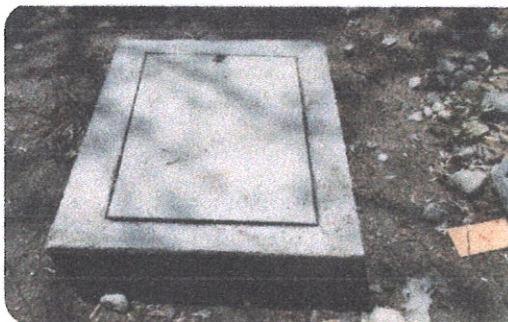

2015-2018  
**OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**

*[Handwritten signature]*
