



**FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2016)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.**



TESORERIA MUNICIPAL
2015-2018

[Handwritten signature]

MUNICIPIO: CHICOASEN, CHIAPAS. No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL: _____
 LOCALIDAD: CHICOASEN (BARRIO SAN ISIDRO)
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
 RUBRO: AYS.- AGUA Y SANEAMIENTO.
 PROGRAMA: RED DE ALCANTARILLADO
 SUB-PROG: C.- CONSTRUCCION. NUMERO DE OBRA: 029-03-014.



2015-2018

SINDICATURA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$1,033,102.30	F.I.S.M	\$1,033,102.30	F.I.S.M	\$0.00
BENEFICIARIO	\$0.00	BENEFICIARIO	\$0.00	BENEFICIARIO	\$0.00
TOTAL	\$1,033,102.30	TOTAL	\$1,033,102.30	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO.

Descripcion de la Obra **Numero de Contrato**
 CONSTRUCCION DE 333.45 ML DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO PARA 34 DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", PLANTILLA, RELLENO ACARREOS Y LA CONSTRUCCION DE 14 POZOS DE VISITA. DOHAC/FISM/014/2016

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio
 Programado real 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Avances

Fisico: 100 %
 Financiero: 100 %


29 DE DICIEMBRE DE 2016.

Convenios Modificatorios

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

Observaciones

Fotografia de Obra Terminada

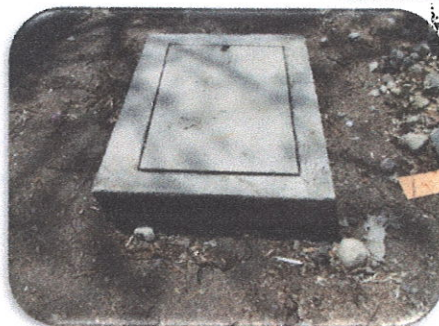

2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
